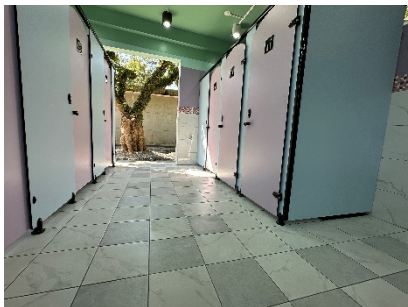
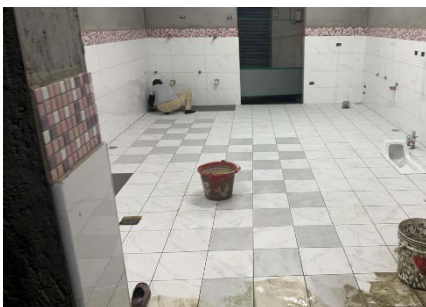
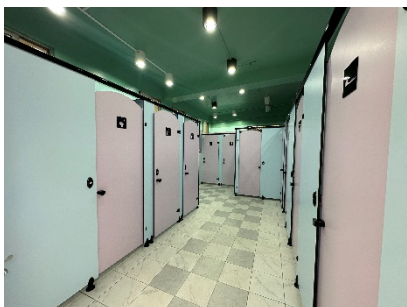


廁所整修與改善記錄

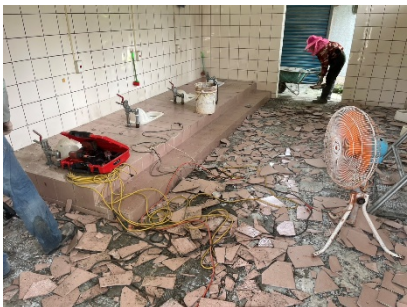
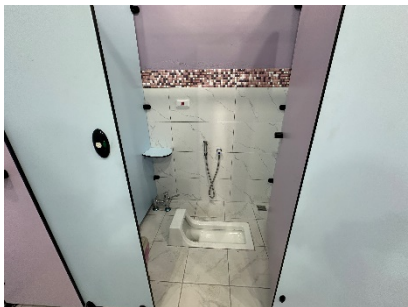
一、改善項目：入口處鋪面破碎濕滑

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：原入口處鋪面破碎。	說明：入口處施工中。	說明：入口處鋪面完整。
		
說明：原入口處洗手台周圍地板不平整，且長滿青苔，易濕滑。	說明：入口處及洗手台鋪面整修中。	說明：整修後洗手檯地板平整，洩水坡度適宜利於排水。

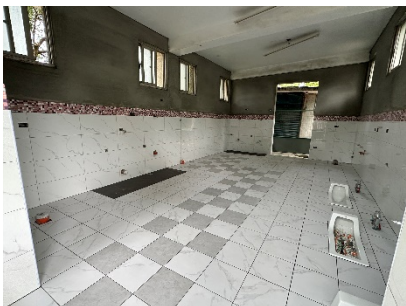
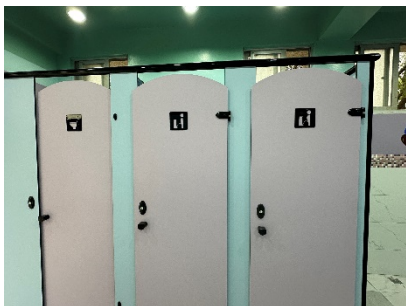
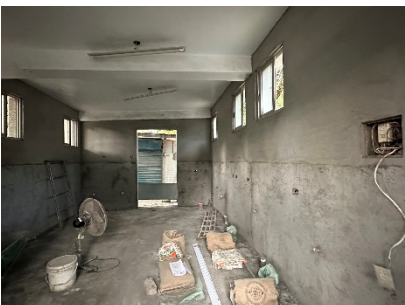
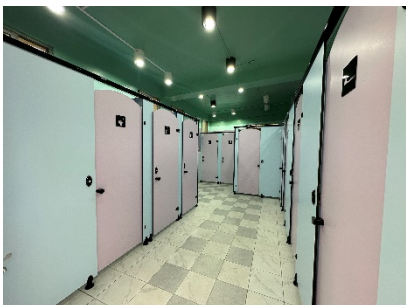
二、改善項目：如廁空間具高低差，磁磚止滑效果不佳

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：如廁空間具高低差	說明：廁間高低差打除	說明：廁所內整體地面平整，磁磚較具止滑效果。
		
說明：如廁空間具高低差，原磁磚止滑效果不佳。	說明：廁間高低差打除	說明：廁所內整體地面平整，磁磚較具止滑效果。
		
說明：如廁空間具高低差。	說明：廁間高低差整平，鋪設磁磚。	說明：廁所內整體地面平整，磁磚較具止滑效果。

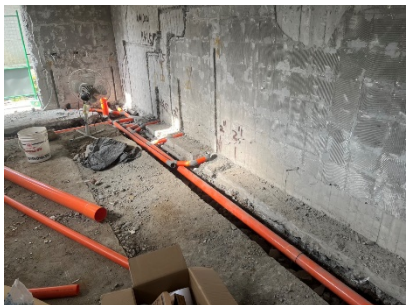
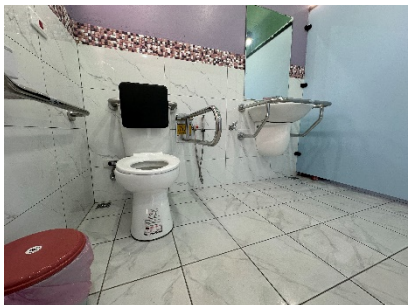
三、改善項目：廁所空間太小，設備不完善，且未考量年齡差異

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：如廁空間太小，非常窘迫。	說明：如廁空間打除，重新安排。	說明：如廁空間調整，並增設緊急求助鈴，讓使用者更便利及安心。
		
說明：如廁便器太小，易造成髒污難除。	說明：如廁空間打除，重新安排。	說明：使用加大的便器，友善使用者的體驗感受，並增設沖洗設備。
		
說明：如廁便器及空間過小，且男性小便斗無遮蔽，亦未考量年齡差異。	說明：如廁空間打除，重新安排。	說明：考量使用者年齡及身高設置便器，調整合理空間，並增設隔間，加強隱私保護。

四、改善項目：指示標示不清，空間色調單一，光線不足

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：如廁空間標示雜亂，整體色調單一。	說明：如廁空間施工改善	說明：改善後如廁間標示清楚。
		
說明：如廁空間標示雜亂，整體色調單一。	說明：運用多層次媒材豐富廁所整體風貌	說明：改善後如廁空間標示清楚。
		
說明：舊有燈具較少，亮度不足。	說明：燈具施工改善。	說明：改善後，無論是隔間還是走道，都有充足燈光。

五、改善項目：改善設施耐久性

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
 說明：原洗手台未考量年紀差異，且磁磚接縫多處破損長黴，排水不順。	 說明：洗手台整修中。	 說明：設置考量身高差異的洗手台，並透過紫斑蝶主題之馬賽克及抵石子相互點綴，增加廁所整體童趣。
 說明：舊的汙水處理設備已明顯損壞。	 說明：新汙水處理設備埋設及接管。	 說明：整修後汙水處理設備留設清潔口，並加以綠化。
 說明：無障礙廁所設備老舊，多處損壞，且已不合法規要求。	 說明：整體廁所管線配置明確，利於後續維護。	 說明：整修後之無障礙廁所設備正常，符合法規。

